

TRẮC NGHIỆM: 20 CÂU

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ Câu hỏi

Thời gian còn lại 0:14:01

(LO.1.1) Tiêu chuẩn SMART dùng để đánh giá mục tiêu của dự án là:

Chọn một:

☐ a. Cụ thể (Specific) – Đo được (Measureable) – Có thể định giá (Assessable) – Thực tiễn (Realistic) – Hạn chế thời gian (Time-Bound)

☐ b. Cụ thể (Specific) – Đo được (Measureable) – Phân công được (Assignable) – Thực tiễn (Realistic) – Hạn chế thời gian (Time-Bound)

☐ c. Đặc biệt (Special) – Đo được (Measureable) – Phân công được (Assignable) – Thực tiễn (Realistic) – Hạn chế thời gian (Time-Bound)

☐ d. Đặc biệt (Special) – Đo được (Measureable) – Có thể định giá (Assessable) – Thực tiễn (Realistic) – Hạn chế thời gian (Time-Bound)

Điều hướng bài kiểm tra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

Hoàn thành bài làm ...

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ Câu hỏi

Thời gian còn lại 0:12:33

(LO.1.1) Khi thực hiện rút ngắn tiến độ dự án, ta chọn rút ngắn công tác:

Chọn một:

☐ a. Không nằm trên đường găng, có chi phí rút ngắn đơn vị nhỏ nhất

☐ b. Không nằm trên đường găng, có chi phí rút ngắn đơn vị lớn nhất

☐ c. Nằm trên đường găng, có chi phí rút ngắn đơn vị lớn nhất

☐ d. Nằm trên đường găng, có chi phí rút ngắn đơn vị nhỏ nhất

Điều hướng bài kiểm tra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

Hoàn thành bài làm ...

Câu hỏi 3

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ Câu hỏi

Thời gian còn lại 0:12:23

(LO.1.1) Theo tác giả Lewis, tư duy hệ thống PHẢI bao gồm các phản hồi (feedback) để tạo thành vòng tuần hoàn.

Chọn một:

☐ a. Sai

☐ b. Đúng

Điều hướng bài kiểm tra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

Hoàn thành bài làm ...

Chuyển tới...

Bài toán 1

Trang kế tiếp

Thời gian còn lại 0:12:03

Câu hỏi 4

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ Câu hỏi

(LO.1.1) Điểm giống nhau giữa tư duy hệ thống (SystemThinking) và tư duy tuyến tính (Linear Thinking) là tính chất phản hồi

Chọn một:

☐ a. Sai

☐ b. Đúng

Trang kế tiếp

Điều hướng bài kiểm tra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

Hoàn thành bài làm ...

Thời gian còn lại 0:11:49

Câu hỏi 5

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ Câu hỏi

(LO.1.1) Trên sơ đồ mạng AOA của 1 dự án

Chọn một:

☐ a. Có thể có nhiều sự kiện kết thúc

☐ b. Có thể có nhiều đường găng

☐ c. Các công việc tạo thành một vòng khép kín

☐ d. Cho thấy công nghệ được sử dụng trong dự án

Trang kế tiếp

Điều hướng bài kiểm tra


1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

Hoàn thành bài làm ...

TỰ LUẬN: GỒM 4 CÂU

Bài toán 1

Cho sơ đồ mạng AON của một dự án như hình vẽ.

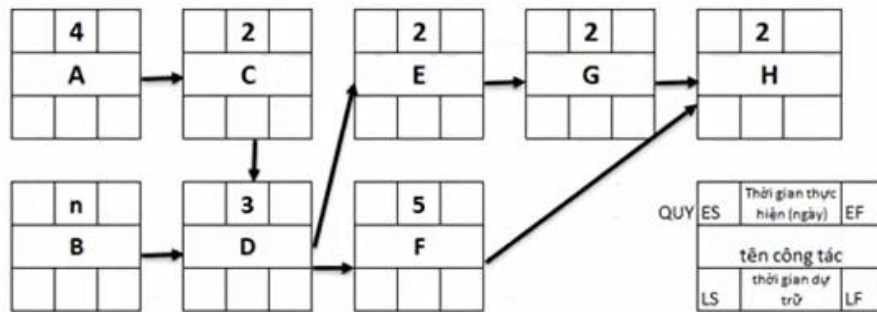

$n = 6$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 0,2,4,6,8

$n = 7$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 1,3,5,7,9

$n = 6$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 0,2,4,6,8

$n = 7$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 1,3,5,7,9

Thời gian còn lại 0:09:37

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Thời gian bắt đầu sớm nhất ES của công tác D là:	
2	Thời gian bắt đầu sớm nhất ES của công tác C là:	
3	Thời gian bắt đầu sớm nhất ES của công tác F là:	
4	Thời gian bắt đầu sớm nhất ES của công tác G là:	
5	Thời gian kết thúc trễ nhất LF của công tác C là:	
6	Thời gian kết thúc trễ nhất LF của công tác E là:	
7	Thời gian kết thúc trễ nhất LF của công tác A là:	
8	Thời gian dự trữ của công tác A là:	

Bài toán 2

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 20,00

🚩 Cờ câu hỏi

Thời gian còn lại 0:14:49

1

2

Hoàn thành bài

Cho thông tin dự án Alpha như sau:

Công tác	Công tác trước	Thời gian thực hiện (tuần)	Chi phí dự tính (PV) - \$	Chi phí thực tế (AC) - \$	% hoàn thành ghi nhận tại tuần 4
A	-	3	4N0	450	100%
B	-	2	240	250	100%
C	-	7	700	700	75%
D	C	2	400	0	0%
E	A	3	600	0	0%
F	-	4	1000	1000	80%

N là số cuối trong MSSV, VD: MSSV: 19201234 thì N = 4

Sai lệch về chi phí = CV ;
Sai lệch về tiến độ = SV

↕
A ▾
B
I
☰
☷
☰
☷
🔗
🔄
😊
🖼️

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Sai lệch về chi phí của công tác A tại tuần 4 là:	
2	Nhận xét về chi phí của công tác A tại tuần 4 là:	
3	Sai lệch về tiến độ của công tác C tại tuần 4 là:	
4	Nhận xét về tiến độ của công tác C tại tuần 4 là:	
5	Sai lệch về chi phí của toàn bộ dự án tại tuần 4 là:	
6	Nhận xét về chi phí của toàn bộ dự án tại tuần 4 là:	
7	Sai lệch về tiến độ của toàn bộ dự án tại tuần 4 là:	

Bài toán 3

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chăm điểm của 15,00

Cờ câu hỏi

Thời gian còn lại 0:09:38

Điều hướng bài

1

2

Hoàn thành bài

Cho dự án Beta với các thông tin như sau:

Công tác	Công tác trước	Thời gian lạc quan a (ngày)	Thời gian thường gặp m (ngày)	Thời gian bi quan b (ngày)
A	-	2	2	2
B	-	1	4	13
C	A	2	3	4
D	A	2	3	10
E	C	6	8	10
F	B	4	6	8

Lưu ý:

$n = 2$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 0,2,4,6,8

$n = 4$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 1,3,5,7,9

Lưu ý:

$n = 2$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 0,2,4,6,8

$n = 4$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 1,3,5,7,9

↕

A ▼

B

I

☰

☷

☶

☱

🔗

🔄

😊

🖼️

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Thời gian hoàn thành dự án kỳ vọng	
2	Giá trị Z khi thời gian mong muốn hoàn thành là 1n ngày	
3	Xác suất để hoàn thành dự án Beta trong 1n ngày	

Bài toán 4:

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 10,00

Cờ câu hỏi

Thời gian còn lại 0:13:01

Điều hướng bài

12

Hoàn thành bài làm

Cho thông tin dự án Alpha như sau:

Công tác	Công tác trước	Thời gian thực hiện (tuần)	Số công lao động/ tuần
A	-	3	5
B	-	2	2
C	-	7	4
D	C	2	3
E	A	3	4
F	-	4	3

N là số cuối trong MSSV , VD: MSSV: 19201234 thì N = 4

N là số cuối trong MSSV , VD: MSSV: 19201234 thì N = 4

↕

A▼

B

I

≡

≡

≡

≡

🔗

🔄

😊

🖼

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Xác định đường Găng của dự án	
2	Thời gian cần để hoàn thành dự án	
3	Khi chưa thực hiện điều hòa, nhu cầu nguồn lực cao nhất là bao nhiêu? Vào thời điểm nào?	
4	Khi chưa thực hiện điều hòa, nhu cầu nguồn lực thấp nhất là bao nhiêu? Vào thời điểm nào?	
