

Đề thi Quản lý dự án cho kỹ sư (IM1025)_16/8/2021_13g00 (DH_HK202)

Trang chủ / Phòng thi của tôi / IM1025_1_DH_HK202

Quy tắc thi:

- 1) Sinh viên có thể tham khảo 1 tờ A4 viết tay, các tài liệu in ấn và các tệp đã tải xuống (không sử dụng tìm kiếm trên internet).
- 2) Bài thi cuối kỳ bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán. Lưu ý: Trả lời tuân tự từng câu hỏi, khi đã bỏ qua một câu hỏi là không thể quay lại.
- 3) Sinh viên phải làm theo trình tự: làm câu hỏi trắc nghiệm trước, sau đó làm Bài toán 1, làm Bài toán 2... Mỗi phần đều có thời gian mở và kết cụ thể nên các em lưu ý nhé!
- 4) Các bạn được yêu cầu ghi màn hình chính (màn hình làm bài) của các bạn và nộp lại file ghi hình. Để nhẹ file, các bạn nên dùng app Debut, chọn chế độ 5s ghi một hình (time-lapse). Ghi hình trong suốt thời gian dự thi (từ lúc vào phòng thi đến khi kết thúc).

*** Đặt tên video theo quy định của nhà trường: <ngày thi yyyy-mm-dd> <Mã môn học> <MSSV> VD: 2021-08-16 IM2011 19234567

*** Các bạn cần nộp video ghi hình màn hình chính này trong vòng 48h kể từ lúc kết thúc thi đến: >>Link<<

*** Các bạn cũng cần upload video này lên Google Drive của mình, và gửi đường link đến: >>Link<<

(Các bạn sẽ có thể không được công nhận kết quả thi nếu trường và giảng viên không nhận được video/link upload video sau 48h)



Câu hỏi trắc nghiệm

Phần thi được mở từ 12:55 đến 13:20. Thời gian làm bài tối đa là 15ph.



Bài toán 1

Phần thi sẽ được mở từ 13:10 đến 13:30. Phần thi cần phải được hoàn thành trong 10ph.



Bài toán 2

Phần thi sẽ được mở từ 13:20 đến 13:45. Phần thi cần phải được hoàn thành trong 15ph.

Câu hỏi trắc nghiệm

Opened: Thứ hai, 16 Tháng tám 2021, 12:55 PM

Closes: Thứ hai, 16 Tháng tám 2021, 1:20 PM

Phần thi được mở từ 12:55 đến 13:20. Thời gian làm bài tối đa là 15ph.

Số lần làm bài cho phép: 3

Giới hạn thời gian: 15 phút

Phương thức chấm điểm: Điểm cao nhất

Làm bài kiểm tra ngay bây giờ

Thời gian còn lại 0:14:50

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Tiêu chuẩn SMART dung để đánh giá mục tiêu của dự án là:

Chọn một:

- ☐ a. Cụ thể (Specific) – Đo được (Measureable) – Có thể định giá (Assessable) – Thực tiễn (Realistic) – Hạn chế thời gian (Time-Bound)
- ☐ b. Cụ thể (Specific) – Đo được (Measureable) – Phân công được (Assignable) – Thực tiễn (Realistic) – Hạn chế thời gian (Time-Bound)
- ☐ c. Đặc biệt (Special) – Đo được (Measureable) – Phân công được (Assignable) – Thực tiễn (Realistic) – Hạn chế thời gian (Time-Bound)
- ☐ d. Đặc biệt (Special) – Đo được (Measureable) – Có thể định giá (Assessable) – Thực tiễn (Realistic) – Hạn chế thời gian (Time-Bound)

Thời gian còn lại 0:12:02

Câu hỏi **2**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(LO.1.1) Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không phải là mục đích của việc cân bằng nguồn lực trong quản lý dự án:

Chọn một:

- ☐ a. Tạo thêm việc làm cho xã hội từ việc thực hiện dự án
- ☐ b. Giảm bớt công sức/ nỗ lực quản lý dự án
- ☐ c. Tăng cường sự ổn định trong việc triển khai
- ☐ d. Có thể làm giúp giảm chi phí thực hiện dự án

Thời gian còn lại 0:11:30

Câu hỏi **3**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(LO.1.1) Khi thực hiện rút ngắn tiến độ dự án, ta chọn rút ngắn công tác:

Chọn một:

- ☐ a. Nằm trên đường găng, có chi phí rút ngắn đơn vị nhỏ nhất
- ☐ b. Không nằm trên đường găng, có chi phí rút ngắn đơn vị lớn nhất
- ☐ c. Không nằm trên đường găng, có chi phí rút ngắn đơn vị nhỏ nhất
- ☐ d. Nằm trên đường găng, có chi phí rút ngắn đơn vị lớn nhất

Thời gian còn lại 0:10:17

Câu hỏi **4**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(LO.1.1) Công việc ảo (công tác ảo) chỉ tồn tại trong:

Chọn một:

- ☐ a. Tất cả các dạng sơ đồ
- ☐ b. Sơ đồ mạng dạng AON
- ☐ c. Sơ đồ mạng dạng AOA
- ☐ d. Sơ đồ Gantt

Thời gian còn lại 0:08:53

Câu hỏi **5**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(LO.1.1) Khi thảo luận về tư duy hệ thống, James Lewis cho rằng: hệ thống ổn định nhất là hệ thống đối xứng/cân bằng (the most stable system is one that is symmetrical).

Chọn một:

- ☐ a. Sai
- ☐ b. Đúng

Thời gian còn lại 0:08:22

Câu hỏi 6

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Khi thực hiện đánh giá hiệu suất dự án ở giai đoạn kết thúc dự án, không nên:

Chọn một:

- ☐ a. Tất cả đều sai
- ☐ b. So sánh hiệu suất giữa các cá nhân trong nhóm dự án với nhau
- ☐ c. Khởi đầu việc đánh giá hiệu suất bằng việc để cá nhân tự đánh giá hiệu suất của mình
- ☐ d. Nhất quán và công bằng đối với tất cả các thành viên

Thời gian còn lại 0:07:50

Câu hỏi 7

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Gọi S là thời gian kỳ vọng để hoàn thành dự án, D là thời gian mong muốn hoàn thành dự án. Nếu $D = S$ thì:

Chọn một:

- ☐ a. Xác suất hoàn thành dự án = 100%
- ☐ b. Xác suất hoàn thành dự án = 50%
- ☐ c. Xác suất hoàn thành dự án = 30%
- ☐ d. Chưa đủ thông tin để kết luận

Thời gian còn lại 0:07:39

Câu hỏi 8

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) WBS (cấu trúc phân việc) là phương pháp xác định có hệ thống các công việc của 1 dự án bằng cách:

Chọn một:

- ☐ a. Phân công công việc cho từng cá nhân nhờ vào ma trận trách nhiệm
- ☐ b. Chia nhỏ dự án thành các công việc nhỏ dần, với mức độ chi tiết, cụ thể hơn
- ☐ c. Áp dụng kỹ thuật phân tích CPM/ PERT để xác định thời gian hoàn thành dự án
- ☐ d. Dùng tiêu chuẩn SMART đánh giá mục tiêu dự án

Thời gian còn lại 0:07:01

Câu hỏi 9

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Trên sơ đồ mạng AOA của 1 dự án

Chọn một:

- ☐ a. Có thể có nhiều đường găng
- ☐ b. Cho thấy công nghệ được sử dụng trong dự án
- ☐ c. Có thể có nhiều sự kiện kết thúc
- ☐ d. Các công việc tạo thành một vòng khép kín

Thời gian còn lại 0:06:29

Câu hỏi **10**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(LO.1.1) Hoạch định (lập kế hoạch) là sự kiện chỉ thực hiện 1 lần trong suốt toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Thời gian còn lại 0:06:08

Câu hỏi **11**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(LO.1.1) Điểm giống nhau giữa tư duy hệ thống (SystemThinking) và tư duy tuyến tính (Linear Thinking) là tính chất phản hồi

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Thời gian còn lại 0:04:12

Câu hỏi **12**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(LO.1.1) Theo tác giả Lewis, Dự án chắc chắn được xem là thất bại khi một trong các tiêu chí (P, T, S, C) không đạt yêu cầu như dự tính.

Chọn một:

- ☐ a. Sai
- ☐ b. Đúng

Thời gian còn lại 0:03:40

Câu hỏi **13**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(LO.1.1) Nhược điểm của phương pháp kiểm soát chi phí truyền thống là:

Chọn một:

- ☐ a. Không phản ánh được tiến độ ứng với chi phí của dự án
- ☐ b. Không phản ánh được chi phí thực của dự án
- ☐ c. Cách tính toán phức tạp
- ☐ d. Không cho biết thời gian đã trải qua của dự án

Thời gian còn lại 0:02:28

Câu hỏi **14**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Trong phương pháp phân tích và đánh giá tổng quan dự án (PERT), thời gian thực hiện các công tác:

Chọn một:

- ☐ a. Tuân theo hàm phân phối xác suất
- ☐ b. Là hằng số
- ☐ c. Tất cả đều sai
- ☐ d. Tất cả đều đúng

Thời gian còn lại 0:01:51

Câu hỏi **15**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Theo tác giả Lewis, tư duy hệ thống PHẢI bao gồm các phản hồi (feedback) để tạo thành vòng tuần hoàn.

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Thời gian còn lại 0:01:43

Câu hỏi **16**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Một dự án có thể có nhiều hơn 1 đường găng (đường tới hạn)

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Thời gian còn lại 0:01:38

Câu hỏi **17**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Việc ký hợp đồng với các công ty bảo hiểm là giải pháp để:

Chọn một:

- ☐ a. Tránh rủi ro
- ☐ b. Chuyển giao rủi ro
- ☐ c. Các lựa chọn khác đều đúng
- ☐ d. Chấp nhận rủi ro

Thời gian còn lại 0:00:59

Câu hỏi **18**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Trên sơ đồ Gantt của một dự án:

Chọn một:

- ☐ a. Thời gian thực hiện các công việc được biểu diễn trên trục tung
- ☐ b. Không cho thấy rõ tổng thời gian thực hiện các công việc
- ☐ c. Các phát biểu đều sai
- ☐ d. Các công việc được biểu diễn trên trục hoành

Thời gian còn lại 0:00:11

Câu hỏi **19**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Để công việc đánh giá hiệu suất của dự án được chính xác, nên:

Chọn một:

- ☐ a. Để việc đánh giá cá nhân cho người quản lý chức năng chịu trách nhiệm
- ☐ b. Tất cả đều đúng
- ☐ c. Tất cả đều sai
- ☐ d. Thời gian, chi phí, và tiêu chuẩn kỹ thuật dự án là 3 khía cạnh cần tập trung vào khi đo lường hiệu suất nhóm

Thời gian còn lại 0:00:08

Câu hỏi **20**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Một trong các trường hợp thường thấy khi kết thúc dự án là dự án _____.

Chọn một:

- ☐ a. Không đạt mục tiêu
- ☐ b. Được hoàn tất
- ☐ c. Vượt ngân sách
- ☐ d. Bị kéo dài

Bài toán 1

Opened: Thứ hai, 16 Tháng tám 2021, 1:10 PM

Closes: Thứ hai, 16 Tháng tám 2021, 1:30 PM

Phần thi sẽ được mở từ 13:10 đến 13:30. Phần thi cần phải được hoàn thành trong 10ph.

Số lần làm bài cho phép: 2

Giới hạn thời gian: 10 phút

Phương thức chấm điểm: Điểm cao nhất

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Không được chấm điểm

🚩 Cờ câu hỏi

Bạn hãy cho biết chữ số cuối cùng trong MSSV của bạn:

Câu trả lời:


Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 24,00

🚩 Cờ câu hỏi

Cho sơ đồ mạng AON của một dự án như hình vẽ.

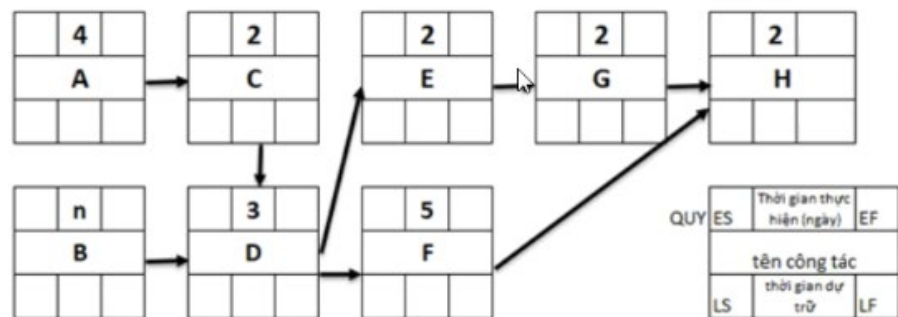

$n = 6$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 0,2,4,6,8

$n = 7$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 1,3,5,7,9

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Thời gian bắt đầu sớm nhất ES của công tác D là:	
2	Thời gian bắt đầu sớm nhất ES của công tác C là:	
3	Thời gian bắt đầu sớm nhất ES của công tác F là:	
4	Thời gian bắt đầu sớm nhất ES của công tác G là:	
5	Thời gian kết thúc trễ nhất LF của công tác C là:	I
6	Thời gian kết thúc trễ nhất LF của công tác E là:	
7	Thời gian kết thúc trễ nhất LF của công tác A là:	
8	Thời gian dự trữ của công tác A là:	
9	Thời gian dự trữ của công tác G là:	1
10	Thời gian dự trữ của công tác H là:	0
11	(Các) đường Găng (đường tới hạn) của dự án:	I
12	Tổng thời gian cần để hoàn thành dự án:	

Bài toán 2

Opened: Thứ hai, 16 Tháng tám 2021, 1:20 PM
Closes: Thứ hai, 16 Tháng tám 2021, 1:45 PM

Phần thi sẽ được mở từ 13:20 đến 13:45. Phần thi cần phải được hoàn thành trong 15ph.

Số lần làm bài cho phép: 2

Giới hạn thời gian: 15 phút

Phương thức chấm điểm: Điểm cao nhất

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Không được chấm điểm

Cờ câu hỏi

Bạn hãy cho biết chữ số cuối cùng trong MSSV của bạn:

Câu trả lời:

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 20,00

Cờ câu hỏi

Cho thông tin dự án Alpha như sau:

Công tác	Công tác trước	Thời gian thực hiện (tuần)	Chi phí dự tính (PV) - \$	Chi phí thực tế (AC) - \$	% hoàn thành ghi nhận tại tuần 4
A	-	3	4N0	450	100%
B	-	2	240	250	100%
C	-	7	700	700	75%
D	C	2	400	0	0%
E	A	3	600	0	0%
F	-	4	1000	1000	80%

N là số cuối trong MSSV, VD: MSSV: 19201234 thì N = 4

↕

A ▾

B

I

≡

≡

≡

≡

🔗

🔄

😊

🖼

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Sai lệch về chi phí của công tác A tại tuần 4 là:	
2	Nhận xét về chi phí của công tác A tại tuần 4 là:	
3	Sai lệch về tiến độ của công tác C tại tuần 4 là: I	
4	Nhận xét về tiến độ của công tác C tại tuần 4 là:	
5	Sai lệch về chi phí của toàn bộ dự án tại tuần 4 là:	
6	Nhận xét về chi phí của toàn bộ dự án tại tuần 4 là:	
7	Sai lệch về tiến độ của toàn bộ dự án tại tuần 4 là:	
8	Nhận xét về tiến độ của toàn bộ dự án tại tuần 4 là:	
9	Chi phí để hoàn thành phần việc còn lại của dự án (ETC) là:	
10	Ước tính lại tổng chi phí để hoàn thành dự án (EAC) là:	

Opened: Thứ hai, 16 Tháng tám 2021, 1:35 PM
Closes: Thứ hai, 16 Tháng tám 2021, 1:55 PM

Số lần làm bài cho phép: 2

Giới hạn thời gian: 10 phút

Phương thức chấm điểm: Điểm cao nhất

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Không được chấm điểm

🚩 Cờ câu hỏi

Câu trả lời:

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 15,00

🚩 Cờ câu hỏi

Công tác	Công tác trước	Thời gian lạc quan a (ngày)	Thời gian thường gặp m (ngày)	Thời gian bi quan b (ngày)
A	-	2	2	2
B	-	1	4	13
C	A	2	3	4
D	A	2	3	10
E	C	6	8	10
F	B	4	6	8

$n = 4$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 1,3,5,7,9

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Thời gian hoàn thành dự án kỳ vọng	13
2	Giá trị Z khi thời gian mong muốn hoàn thành là 1n ngày	I
3	Xác suất để hoàn thành dự án Beta trong 1n ngày	

Bài toán 4

Opened: Thứ hai, 16 Tháng tám 2021, 1:45 PM

Closes: Thứ hai, 16 Tháng tám 2021, 2:00 PM

Phần thi sẽ được mở từ 13:45 đến 14:00. Phần thi cần phải được hoàn thành trong 10ph.

Số lần làm bài cho phép: 2

Phương thức chấm điểm: Điểm cao nhất

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Không được chấm điểm

🚩 Cờ câu hỏi

Bạn hãy cho biết chữ số cuối cùng trong MSSV của bạn:

Câu trả lời:

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 10,00

🚩 Cờ câu hỏi

Thời gian còn lại 0:12:04

Cho thông tin dự án Alpha như sau:

Công tác	Công tác trước	Thời gian thực hiện (tuần)	Số công lao động/ tuần
A	-	3	5
B	-	2	2
C	-	7	4
D	C	2	3
E	A	3	4
F	-	4	3

N là số cuối trong MSSV, VD: MSSV: 19201234 thì $N = 4$

↕	A ▾	B	I	☰	☷	☶	☵	🔗	🔄	😊	🖼️
STT	Câu hỏi		Trả lời								
1	Xác định đường Găng của dự án										
2	Thời gian cần để hoàn thành dự án										
3	Khi chưa thực hiện điều hòa, nhu cầu nguồn lực cao nhất là bao nhiêu? Vào thời điểm nào?										
4	Khi chưa thực hiện điều hòa, nhu cầu nguồn lực thấp nhất là bao nhiêu? Vào thời điểm nào?										
