

Chương 4

ĐỊNH NGHĨA DỰ ÁN

Nội dung

- Năm bước thu thập thông tin dự án.
- Cấu trúc phân chia quá trình.
- Ma trận trách nhiệm.
- Kế hoạch truyền thông dự án.

1. 5 bước để thu thập thông tin dự án

Bước 1: Định nghĩa phạm vi dự án.

Bước 2: Thiết lập thứ tự ưu tiên dự án.

Bước 3: Tạo cấu trúc phân chia công việc.

Bước 4: Tích hợp WBS với tổ chức.

Bước 5: Mã hóa WBS cho hệ thống thông tin.

Bước 1: Định nghĩa phạm vi dự án

Định nghĩa

- Là kết quả cuối cùng hoặc sứ mệnh của dự - một sản phẩm hoặc dịch vụ dành cho khách hàng.
- Xác định các kết quả cần đạt được theo các điều khoản cụ thể, hữu hình và có thể đo lường được.

Mục đích của phát biểu phạm vi dự án

- Để xác định rõ ràng các mục tiêu cung cấp cho người dùng cuối.
- Để tập trung trực tiếp vào mục đích của dự án trong suốt vòng đời của dự án đối với khách hàng và những người tham gia dự án.
- Được công bố và sử dụng bởi chủ dự án và những người tham gia dự án để lập kế hoạch và đo lường thành công của dự án.

Danh sách kiểm tra phạm vi dự án

1. Mục tiêu dự án
2. Mô tả phạm vi dự án.
3. Lý do.
4. Sản phẩm bàn giao.
5. Các mốc quan trọng.
6. Yêu cầu kỹ thuật.
7. Giới hạn và loại trừ.
8. Tiêu chí chấp nhận.

Phạm vi dự án: Các điều khoản và định nghĩa

Phát biểu phạm vi

- Là bản tóm tắt ngắn gọn, dài một đến hai trang về các yếu tố chính của phạm vi, tiếp theo là tài liệu mở rộng về từng yếu tố.
- Cũng được gọi là “tuyên bố công việc (SOW)”.

Điều lệ dự án

- Là tài liệu cho phép người quản lý dự án khởi xướng và lãnh đạo dự án.
- Thường bao gồm mô tả phạm vi ngắn gọn cũng như các mục như giới hạn rủi ro, trường hợp kinh doanh, giới hạn chi tiêu và thậm chí cả thành phần nhóm.

Phạm vi mở rộng

- Là xu hướng phạm vi dự án mở rộng theo thời gian - thường là do thay đổi các yêu cầu, thông số kỹ thuật và ưu tiên.

Phạm vi mở rộng

5 nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng phạm vi mở rộng

- Phân tích yêu cầu kém.
- Không tiếp cận người dùng sớm.
- Đánh giá thấp độ phức tạp của dự án.
- Thiếu kiểm soát sự thay đổi.
- Cần gia tăng sự chắc chắn.

Bước 2: Thiết lập thứ tự ưu tiên dự án


Ba tiêu chí (sự đánh đổi) mà người quản lý dự án phải quản lý là:

- Chi phí (ngân sách)
- Thời gian (lịch trình)
- Thành quả (phạm vi)

Người quản lý dự án có thể quản lý sự đánh đổi của dự án bằng cách hoàn thành ma trận ưu tiên cho dự án và xác định tiêu chí nào là:

- Ràng buộc - tham số ban đầu là cố định.
- Nâng cao - một tiêu chí cần được tối ưu hóa.
- Chấp nhận - một tiêu chí có thể chấp nhận được nếu không đáp ứng được tham số ban đầu.

Sự đánh đổi trong Quản lý dự án

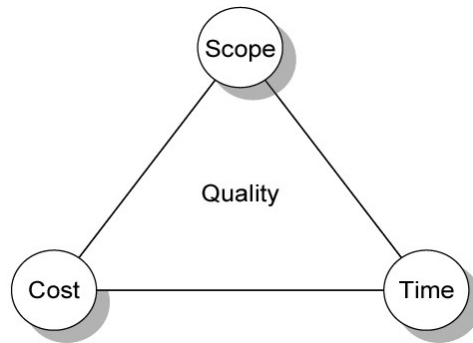

© McGraw-Hill Education

9

Project Priority Matrix for the Development of a New Wireless Router

	Time	Performance	Cost
Constrain		●	
Enhance	●		
Accept			●

© McGraw-Hill Education


10

Bước 3: Tạo cấu trúc phân chia công việc (WBS)

Cấu trúc phân chia công việc (Work Breakdown Structure - WBS)

- Là một phác thảo phân cấp của dự án với các mức độ chi tiết khác nhau.
- Xác định các sản phẩm và yếu tố công việc liên quan đến một dự án.
- Xác định mối quan hệ giữa sản phẩm cuối cùng (dự án) với các sản phẩm phụ của nó và ngược lại, mối quan hệ của chúng với các gói công việc.
- Hoạt động như một khuôn khổ để theo dõi chi phí và thành quả công việc.
- Phù hợp nhất cho các dự án thiết kế và xây dựng có kết quả hữu hình hơn là các dự án theo định hướng quy trình.

Phân cấp của WBS

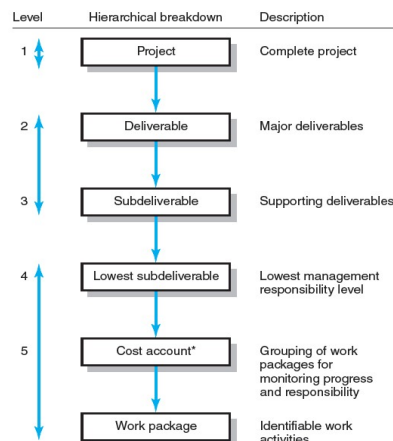


* Sự phân chia này nhóm các gói công việc theo loại công việc trong một sản phẩm và cho phép phân công trách nhiệm cho một đơn vị tổ chức. Bước bổ sung này tạo điều kiện cho một hệ thống giám sát tiến độ dự án.

WBS giúp ích cho người quản lý dự án như thế nào

- Đảm bảo với các nhà quản lý dự án rằng tất cả các sản phẩm và yếu tố công việc đều được xác định, để tích hợp dự án với tổ chức hiện tại và thiết lập cơ sở để kiểm soát.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá chi phí, thời gian và hiệu suất kỹ thuật ở mọi cấp độ trong tổ chức trong suốt vòng đời của dự án.
- Cung cấp cho ban quản lý thông tin phù hợp với từng cấp độ tổ chức.
- Giúp các nhà quản lý dự án lập kế hoạch, lên thời gian biểu và lập ngân sách cho dự án.
- Giúp phát triển cấu trúc phân chia tổ chức (OBS), trong đó phân công trách nhiệm dự án cho các đơn vị và cá nhân trong tổ chức.
- Cung cấp cơ hội để "tổng hợp" ngân sách và chi phí thực tế của các gói công việc nhỏ hơn thành các yếu tố công việc lớn hơn.
- Xác định các kênh truyền thông và hỗ trợ trong việc hiểu và phối hợp nhiều phần của dự án.

Work Breakdown Structure

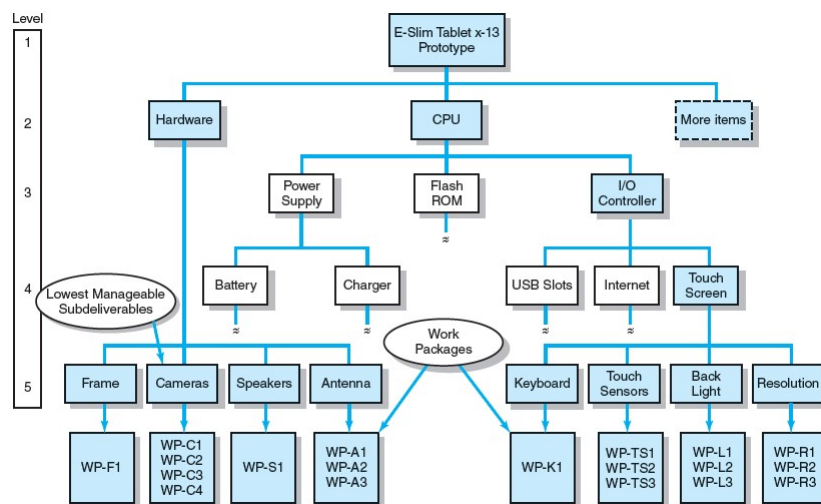

Một gói công việc

- Là mức thấp nhất của WBS.
- Là một nhiệm vụ có thời gian ngắn, có điểm bắt đầu và điểm dừng xác định, tiêu tốn nguồn lực và chi phí.
- Không được vượt quá 10 ngày làm việc hoặc một kỳ báo cáo.
- Nên độc lập với các gói công việc khác của dự án càng nhiều càng tốt.
- Là đơn vị cơ bản được sử dụng cho việc lập kế hoạch, lên thời gian biểu và kiểm soát dự án.

Mỗi gói công việc trong WBS


- Xác định công việc (cái gì).
- Xác định thời gian để hoàn thành một gói công việc (bao lâu).
- Xác định ngân sách theo giai đoạn thời gian để hoàn thành một gói công việc (chi phí).
- Xác định các nguồn lực cần thiết để hoàn thành một gói công việc (bao nhiêu).
- Xác định một người duy nhất chịu trách nhiệm cho các đơn vị công việc (ai).
- Xác định các điểm giám sát để đo lường tiến độ (tốt như thế nào).

Bước 4: Tích hợp WBS với tổ chức

Cấu trúc phân chia tổ chức (Organization Breakdown Structure - OBS)

- Mô tả cách công ty đã tổ chức để giải quyết trách nhiệm công việc.
- Cung cấp một khuôn khổ để tóm tắt hiệu suất công việc của đơn vị tổ chức.
- Xác định các đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm cho các gói công việc.
- Liên kết đơn vị tổ chức với các tài khoản kiểm soát chi phí.

Integration of WBS and OBS

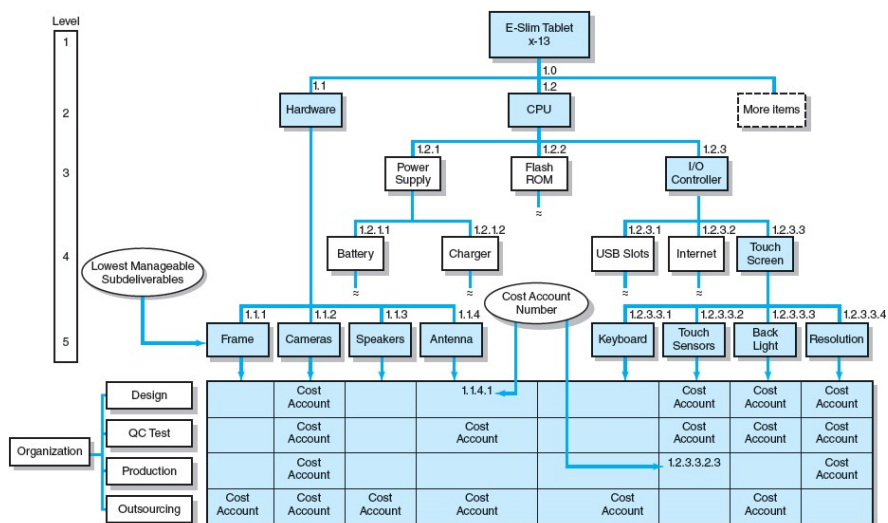

Bước 5: Mã hóa WBS cho hệ thống thông tin

Hệ thống mã hóa WBS

- Định nghĩa
 - Các cấp độ và thành phần trong WBS
 - Thành phần tổ chức.
 - Gói công việc.
 - Thông tin về ngân sách và chi phí
- Cho phép hợp nhất báo cáo ở bất kỳ cấp độ nào trong cấu trúc.

Từ điển WBS

- Cung cấp thông tin chi tiết về mỗi yếu tố trong WBS.

Mã hóa WBS

	Task Mode	Task Name
1		1 E-Slim Tablet x-13 Prototype
2		1.1 Hardware
3		1.1.1 Cameras
4		1.1.2 Speakers
5		1.1.3 Antenna
6		1.2 CPU
7		1.2.1 Power supply
8		1.2.1.1 Battery (more items)
9		1.2.1.2 Charger (more items)
10		1.2.2 Flash Rom (more items)
11		1.2.2.1 I/O controller
12		1.2.2.2 USB slots (more items)
13		1.2.2.3 Internet (more items)
14		1.2.3 Touch screen
15		1.2.3.1 Keyboard
16		1.2.3.1.1 Work package
17		1.2.3.2 Touch sensors
18		1.2.3.2.1 Work package
19		1.2.3.2.2 Work package
20		1.2.3.2.3 Work package
21		1.2.3.3 Back light (more items)
22		1.2.3.4 Resolution (more items)

2. Cấu trúc phân chia quá trình


Cấu trúc phân chia quá trình (Process Breakdown Structure - PBS)

- Được sử dụng cho các dự án theo quá trình.
- Thường được gọi là “phương pháp thác nước” trong ngành công nghiệp phần mềm.

Dự án định hướng theo quá trình (Process-oriented project)

- Là một dự án mà kết quả cuối cùng là sản phẩm của một loạt các bước và giai đoạn.
- Là một dự án phát triển theo thời gian với mỗi giai đoạn ảnh hưởng đến giai đoạn tiếp theo.
- Là một dự án được thúc đẩy bởi các yêu cầu về hiệu suất, không phải bởi các kế hoạch/bản thiết kế.

PBS for Software Development Project

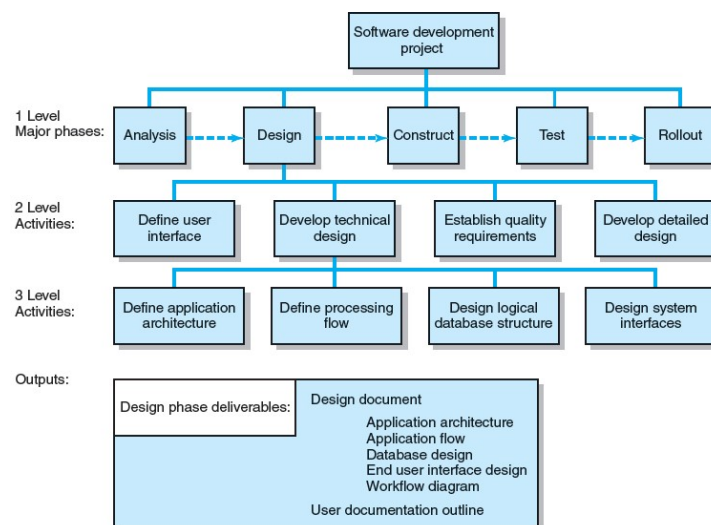

3. Ma trận trách nhiệm

Ma trận trách nhiệm (Responsibility Matrix - RM)

- Cũng được gọi là biểu đồ trách nhiệm tuyến tính.
- Tóm tắt các nhiệm vụ cần hoàn thành và ai chịu trách nhiệm về việc gì trong dự án.
- Liệt kê tất cả các hoạt động của dự án và những người tham gia chịu trách nhiệm cho từng hoạt động.
- Làm rõ các giao diện giữa các đơn vị và cá nhân cần phối hợp.
- Cung cấp phương tiện để tất cả những người tham gia trong một dự án xem xét trách nhiệm của họ và thống nhất về nhiệm vụ của họ.
- Làm rõ phạm vi hoặc loại thẩm quyền mà mỗi người tham gia thực hiện.

Responsibility Matrix for a Market Research Project

Project Team

Task	Richard	Dan	Dave	Linda	Elizabeth
Identify target customers	R	S		S	
Develop draft questionnaire	R	S	S		
Pilot-test questionnaire		R		S	
Finalize questionnaire	R	S	S	S	
Print questionnaire					R
Prepare mailing labels					R
Mail questionnaires					R
Receive and monitor returned questionnaires				R	S
Input response data			R		
Analyze results		R	S	S	
Prepare draft of report	S	R	S	S	
Prepare final report	R		S		

R = Responsible
S = Supports/assists

Responsibility Matrix for the Conveyor Belt Project

Deliverables	Organization							
	Design	Development	Documentation	Assembly	Testing	Purchasing	Quality Assur.	Manufacturing
Architectural designs	1	2			2		3	3
Hardware specifications	2	1				2	3	
Kernel specifications	1	3						3
Utilities specifications	2	1			3			
Hardware design	1			3		3		3
Disk drivers	3	1	2					
Memory management	1	3			3			
Operating system documentation	2	2	1					3
Prototypes	5		4	1	3	3	3	4
Integrated acceptance test	5	2	2		1		5	5

1 Responsible
2 Support
3 Consult
4 Notification
5 Approval

4. Kế hoạch truyền thông dự án


Kế hoạch truyền thông dự án giải quyết các câu hỏi sau:

- Thông tin nào cần được thu thập và khi nào?
- Ai sẽ nhận được thông tin?
- Những phương pháp nào sẽ được sử dụng để thu thập và lưu trữ thông tin?
- Có những giới hạn nào, nếu có, về việc ai có quyền truy cập vào một số loại thông tin nhất định?
- Khi nào thông tin sẽ được truyền đạt?
- Thông tin sẽ được truyền đạt như thế nào?

Các bước để phát triển một kế hoạch truyền thông

1. Phân tích các bên liên quan - xác định các nhóm mục tiêu.
2. Nhu cầu thông tin - báo cáo tình trạng dự án, các vấn đề có thể chuyển giao, thay đổi về phạm vi, cuộc họp tình trạng nhóm, quyết định về công, thay đổi yêu cầu đã chấp nhận, các mục hành động, báo cáo mốc quan trọng, v.v.
3. Nguồn thông tin - thông tin nằm ở đâu?
4. Các phương thức phổ biến - bản cứng, email, hội nghị truyền hình, SharePoint và nhiều chương trình chia sẻ cơ sở dữ liệu khác nhau.
5. Trách nhiệm và thời gian - xác định ai sẽ gửi thông tin và khi nào.

Stakeholder Communications

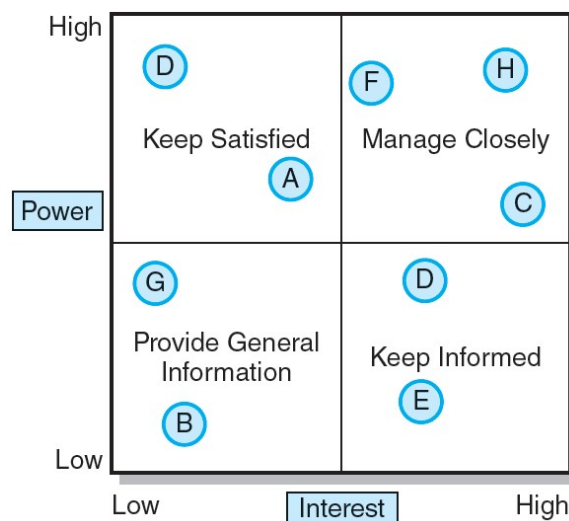

Shale Oil Research Project Communication Plan

<i>What Information</i>	<i>Target Audience</i>	<i>When?</i>	<i>Method of Communication</i>	<i>Provider</i>
Milestone report	Senior management and project manager	Bimonthly	E-mail and hardcopy	Project office
Project status reports & agendas	Staff and customer	Weekly	E-mail and hardcopy	Project manager
Team status reports	Project manager and project office	Weekly	E-mail	Team recorder
Issues report	Staff and customer	Weekly	E-mail	Team recorder
Escalation reports	Staff and customer	When needed	Meeting and hardcopy	Project manager
Outsourcing performance	Staff and customer	Bimonthly	Meeting	Project manager
Accepted change requests	Project office, senior mgmt., customer, staff, and project mgr.	Anytime	E-mail and hardcopy	Design department
Oversight gate decisions	Senior management and project manager	As required	E-mail meeting report	Oversight group or project office
