



Chương 1:

MỞ ĐẦU

1. Đặc tính của một dự án
2. Giới thiệu về quản lý dự án
3. Giới thiệu về nhà quản lý dự án

1



QUẢN LÝ DỰ ÁN


Sau khi học xong chương này sinh viên cần nắm được:

1. Những đặc điểm cơ bản của một dự án.
2. Sự khác biệt giữa dự án và phòng ban chức năng.
3. Các tiêu chuẩn đánh giá việc quản lý dự án.
4. Các chức năng của quản lý dự án.
5. Vai trò của nhà quản lý dự án.


1. ĐẶC TÍNH CỦA MỘT DỰ ÁN



DỰ ÁN LÀ GÌ?

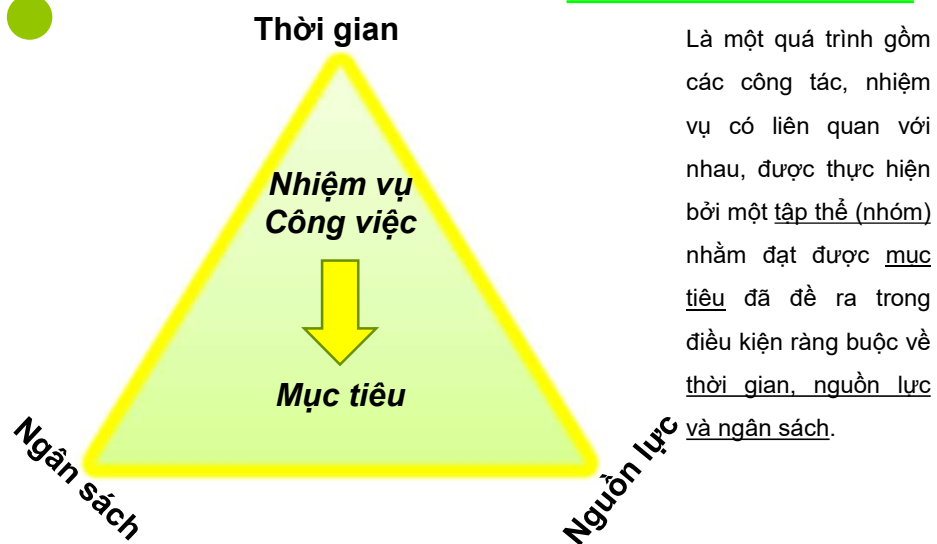

ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN

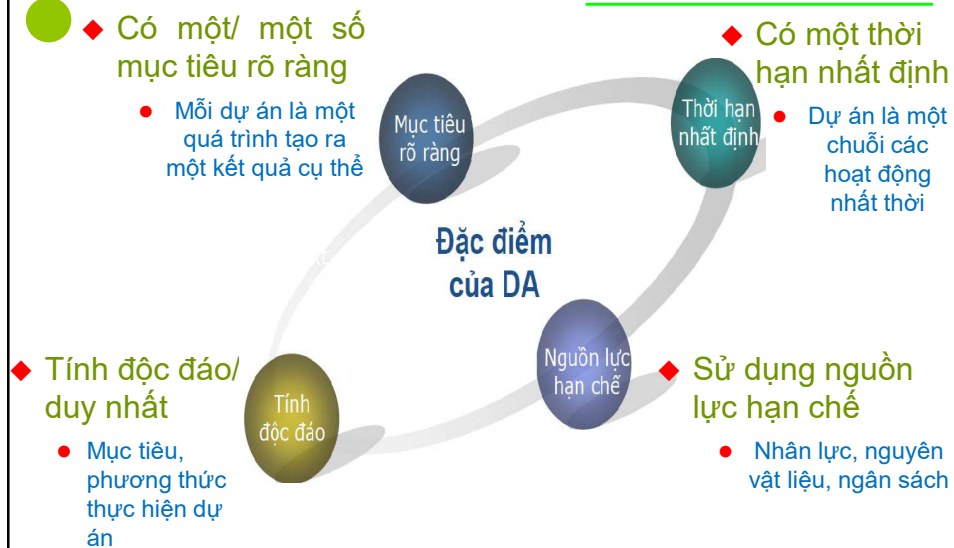

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỘT DỰ ÁN

1. Giai đoạn khởi đầu (Initiation phase)



- Khái niệm (Conception)
- Định nghĩa dự án (Definition)
- Thiết kế (Design)
- Thẩm định (Appraisal)
- Lựa chọn (Selection)
- Bắt đầu triển khai (Start-up)

2. Giai đoạn triển khai (Implementation Phase)

- Hoạch định (Planning)
- Lập tiến độ (Scheduling)
- Tổ chức công việc (Organizing)
- Giám sát (Monitoring)

3. Giai đoạn kết thúc (Controlling)


- Chuyển giao (Handover)
- Đánh giá (Evaluation)

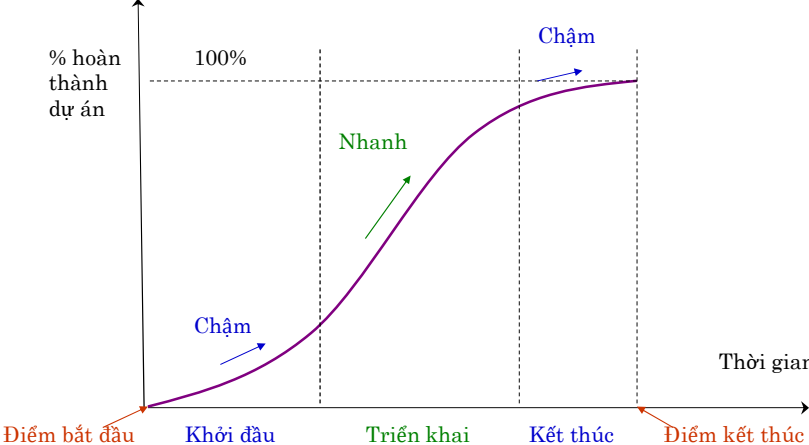

NỖ LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Mức nỗ lực
của DA


Đỉnh (Peak)

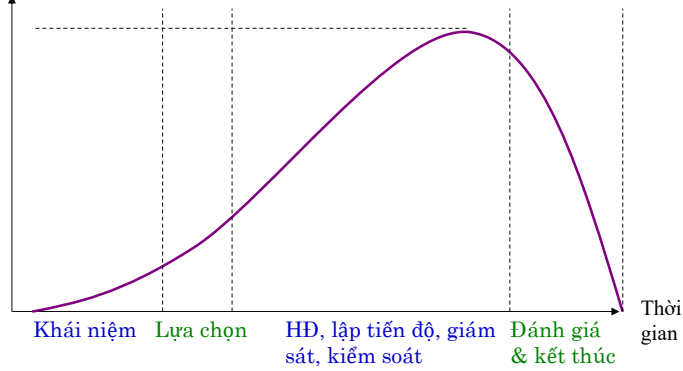


Nỗ lực thực hiện dự án theo thời gian

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ DỰ ÁN

Chi phí
dự án

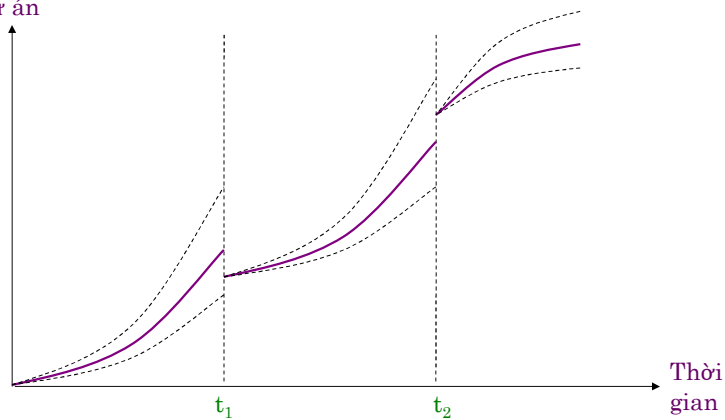

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ

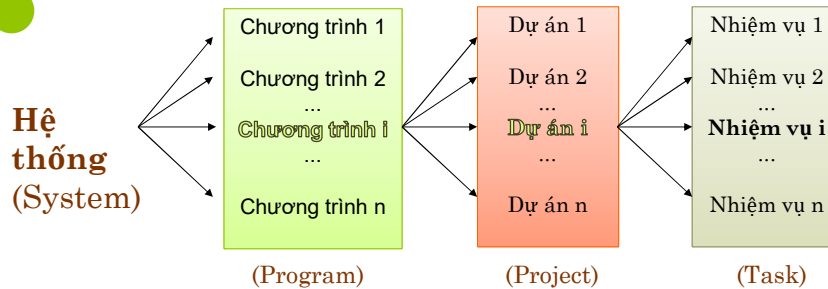

1. Chương trình → kế hoạch dài hạn
2. Dự án
3. Nhiệm vụ → nỗ lực ngắn hạn

DỰ ÁN VS. PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

DỰ ÁN

1. Chu kỳ hoạt động rõ ràng
2. Thời hạn nhất định
3. Có thể kết thúc đột ngột
4. Công việc không lặp lại
5. Ràng buộc về thời gian, nguồn lực
6. Khó dự báo thời gian, CP
7. Nhiều kỹ năng, nguyên tắc; thay đổi theo giai đoạn
8. Tỷ lệ, loại CP thay đổi liên tục
9. Bản chất năng động

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1. Tồn tại lâu dài
2. Không có đặc điểm cụ thể liên quan đến ngày lịch
3. Tồn tại liên tục
4. Công việc đã biết
5. Ngân sách trần hàng năm
6. Tương đối đơn giản
7. Một vài kỹ năng, nguyên tắc
8. Tương đối ổn định
9. Bản chất ổn định



DỰ ÁN VS. PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

	DỰ ÁN	PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
	Phát triển sản phẩm mới	Hoạt động tiếp thị Quản lý sản xuất
	Quản lý chất lượng trong dự án	Quản lý chất lượng
	Ngắn hạn	Dài hạn
Nhân sự	Xuyên chức năng	Theo chức năng
Thẩm quyền tổ chức	Không rõ ràng	Rõ ràng
Kiểm soát	Kế toán theo các công đoạn dự án	Kế toán theo quý/năm
Truyền thông	Dễ bị đứt gãy. Tốn thời gian	Theo qui định/thông lệ. Tron tru
	Độc lập đối với ngành công nghiệp	Đặc thù theo ngành công nghiệp


HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN VÀ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

Nhận định:

- Hoạt động thường xuyên và Dự án có trùng lặp → hoạt động này có thể làm thay đổi hoạt động kia.
- Quá trình lập ngân sách, kỹ năng con người có vẻ giống nhau (kỹ năng viết, báo cáo miệng, giải quyết mâu thuẫn, động viên, kế toán, thương thuyết ...) có thể làm mờ đi sự khác nhau giữa hai lĩnh vực.
- Nhận ra sự khác nhau giữa hai lĩnh vực để hiểu các thách thức đối với nhà Quản lý Dự án.
- Các vấn đề của Dự án cần các nguyên lý quản lý riêng biệt.
- Các loại chu kỳ:
 - Chu kỳ công nghệ;
 - Chu Kỳ Dự án (Project Life Cycle);
 - Chu kỳ phát triển Sản phẩm (Product Development cycle) (*Qui trình phát triển Sản phẩm - Product Development Process*); Chu kỳ Sản phẩm (product life cycle);
 - Chu kỳ Doanh nghiệp/kinh doanh (Business cycle);
 - Chu kỳ công ty (corporation cycle).

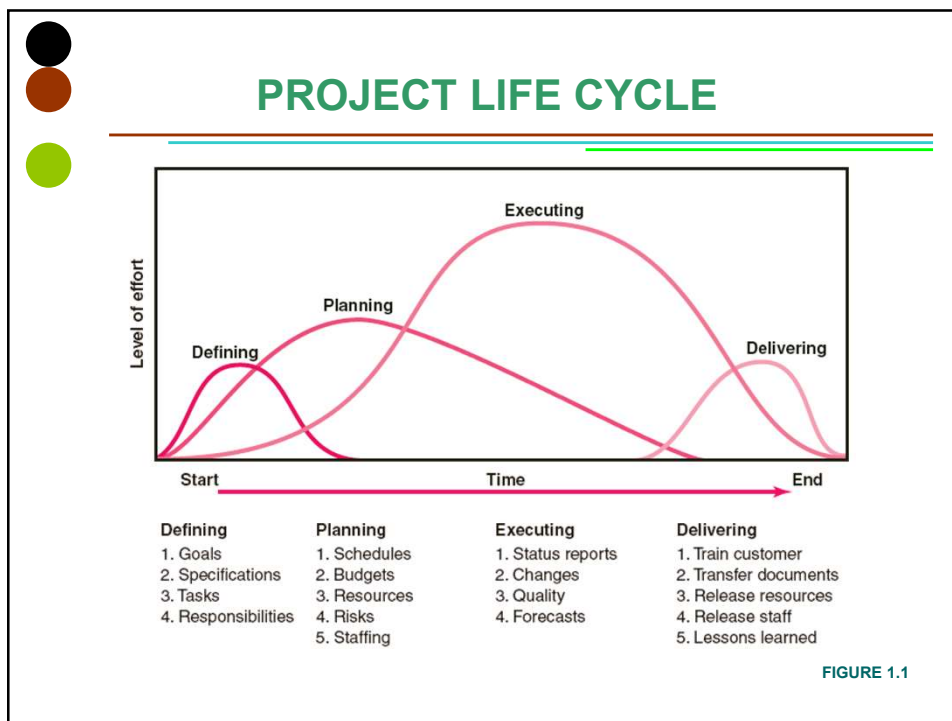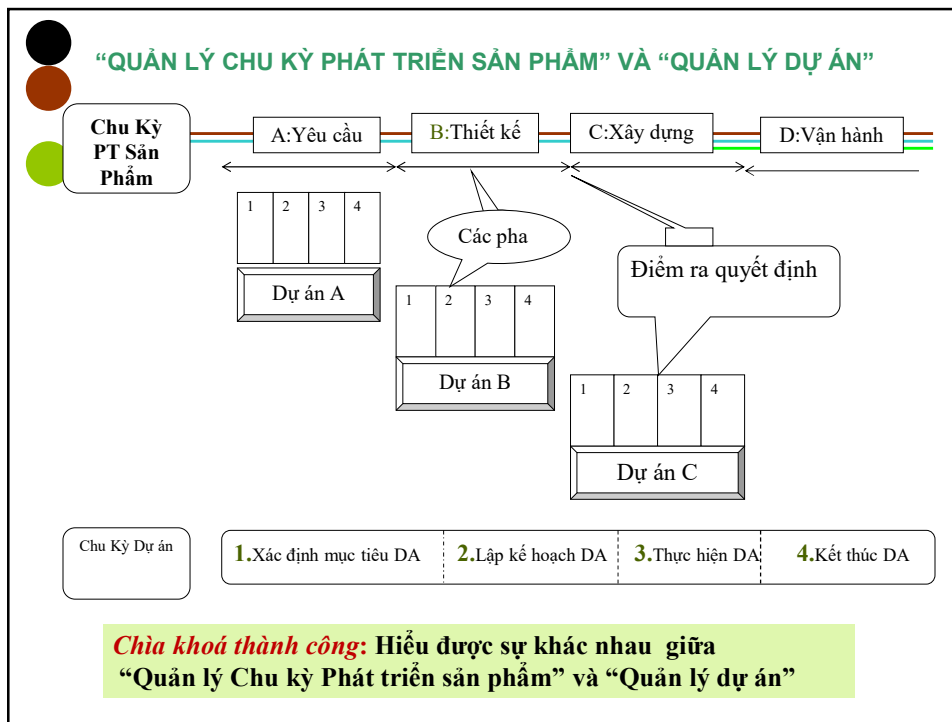

MÔ HÌNH QUẢN LÝ HAY MÔ HÌNH DỰ ÁN?

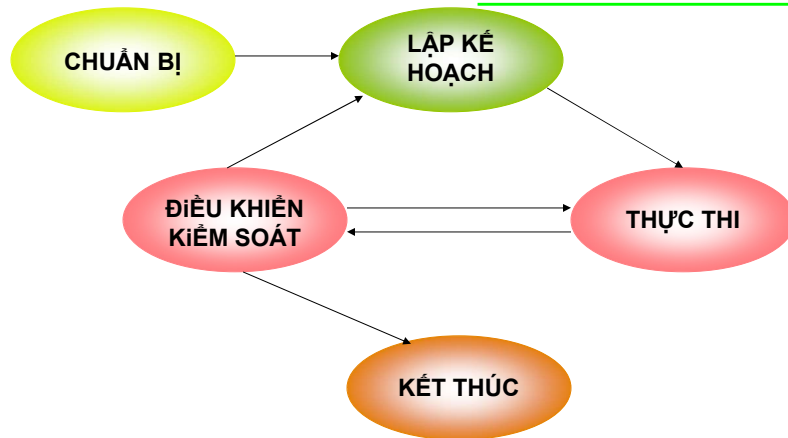

Năm giai đoạn(?) trong một dự án

Quản lý dự án được tiến hành trong các giai đoạn của suốt vòng đời dự án.


CÁC LOẠI DỰ ÁN

1. **Dự án hợp đồng (Contractual project)**: khách hàng cụ thể hay chính phủ, lĩnh vực sản xuất sản phẩm và dịch vụ.
2. **Dự án nghiên cứu và phát triển (R&D Project)**: để phát triển một sản phẩm mới, sửa đổi lớn của sản phẩm hiện có.
3. **Dự án xây dựng (Construction Project)**: cơ sở hạ tầng
4. **Dự án hệ thống thông tin (Information System Project)**: sử dụng hoặc đưa ra những ràng buộc về hệ thống thông tin chung hoặc những thiết bị xử lý thông tin, nhân sự và những tài nguyên khác.
5. **Dự án đào tạo và quản lý (Management & Training Project)**: giảm chi phí chính, tái cấu trúc tổ chức, hợp nhất, thu nhận hoặc loại bỏ việc mở rộng thị trường chính; dự án đào tạo.
6. **Dự án bảo dưỡng lớn (Major Maintenance Project)**
7. **Dự án viện trợ phát triển/ phúc lợi công cộng (Public/Welfare/Development Project)**: dự án tước tiêu

2. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN



QUẢN LÝ DỰ ÁN




♦ Quản lý dự án: một quá trình

- Hoạch định (**Planning**),
- Tổ chức (**Organizing**),
- Lãnh đạo (**Leading/Directing**) và
- Kiểm tra các công việc và nguồn lực (**Controlling**).

=> để hoàn thành các mục tiêu đã định (đó là đạt được kết quả về kỹ thuật, tài chính và thời gian).


TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

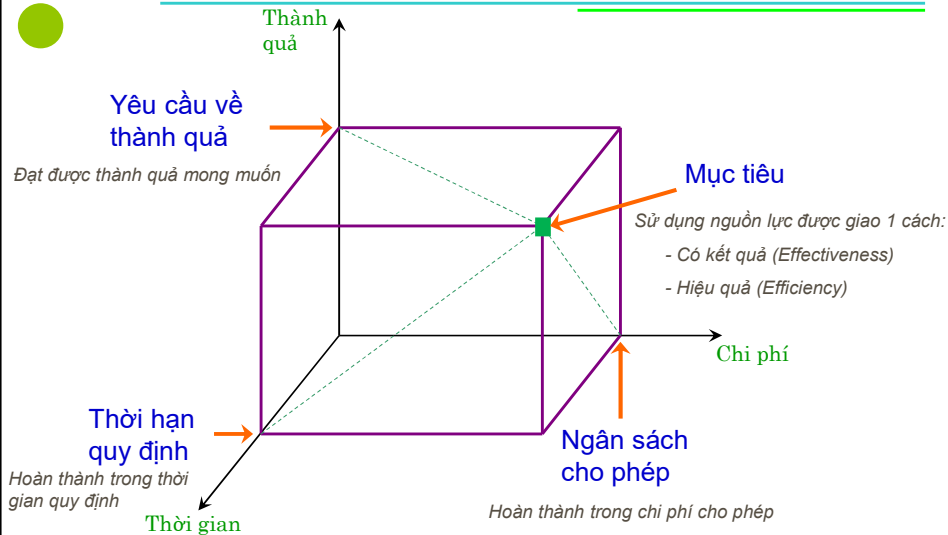


DỰ ÁN THÀNH CÔNG

1. Hoàn thành trong thời hạn quy định (Within Time)
 2. Hoàn thành trong chi phí cho phép (Within Cost)
 3. Đạt được thành quả mong muốn (Desired Performance)
 4. Sử dụng nguồn lực được giao một cách :
 - + Hiệu quả (Effectiveness)
 - + Hữu hiệu (Efficiency) /(hiệu năng)
- On time
 - On budget
 - High quality
 - Functionality :what the product is supposed to do?
 - Performance: How well the Functionality works?
- (Philip Crosby: "quality" is "conformance to requirements")

CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG TRONG QLDA

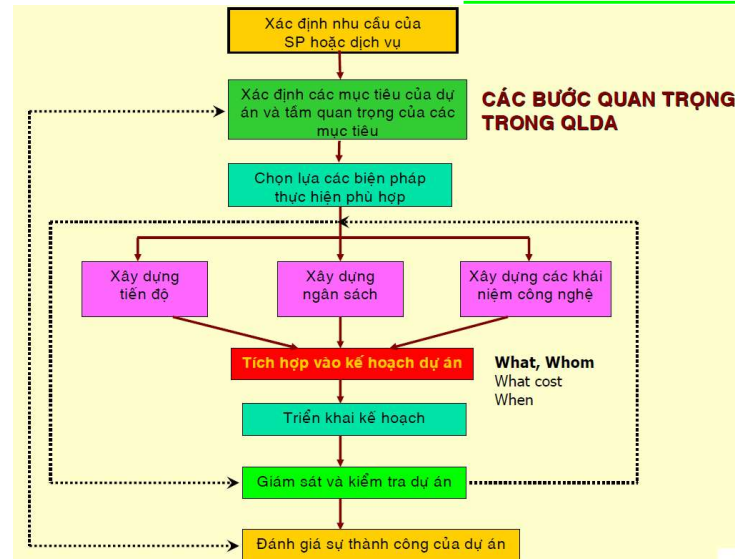

CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG TRONG QLDA-tt

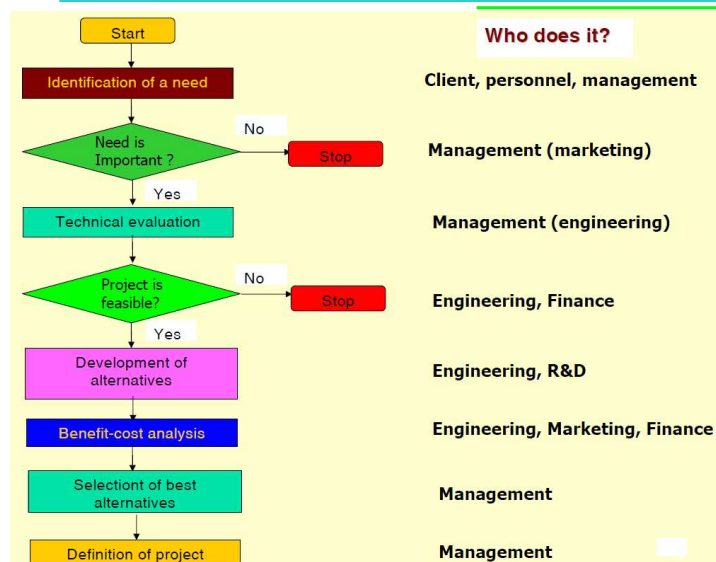



TRỞ LỰC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Độ phức tạp của dự án.
2. Yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
3. Cấu trúc lại tổ chức.
4. Rủi ro trong dự án.
5. Thay đổi công nghệ.
6. Kế hoạch và giá cả cố định.



CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN





CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Hoạch định → cái gì cần phải làm?
 - Xác định mục tiêu.
 - Định phương hướng chiến lược.
 - Hình thành công cụ đạt đến mục tiêu.
2. Tổ chức → công việc được tiến hành như thế nào?
 - Làm việc gì?
 - Ai làm?
 - Phối hợp công việc ra sao?
 - Ai báo cáo cho ai?
 - Chỗ nào cần ra quyết định?




CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN (TT)

3. Lãnh đạo
 - Động viên, hướng dẫn phối hợp.
 - Chọn lựa kênh thông tin.
 - Xử lý mâu thuẫn.
4. Kiểm soát → Đảm bảo hoạt động thực hiện theo kế hoạch và hướng đến mục tiêu
 - Giám sát
 - So sánh
 - Sửa sai

➔ Quản lý dự án là sự kết hợp của nghệ thuật, khoa học và tư duy logic.

CHỨC NĂNG QLDA (theo Eric Verzuh)

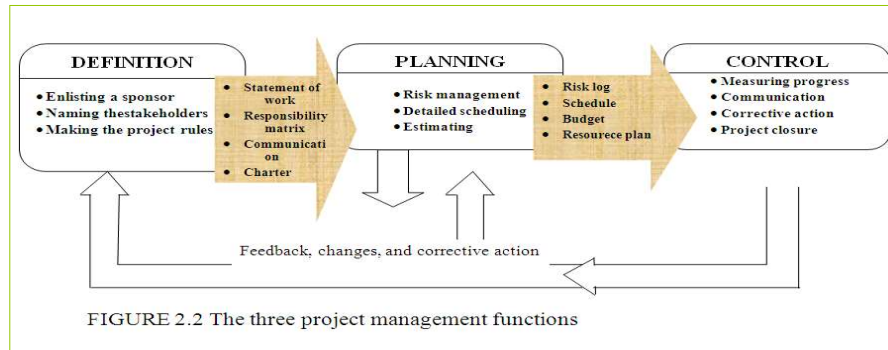

3. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN





GIỚI THIỆU VỀ NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Quản lý các hoạt động tạm thời, không lặp lại và thường xuyên hoạt động độc lập với tổ chức chính thức.
2. Điều phối nguồn lực cho dự án.
3. Là cầu nối trực tiếp với khách hàng.
4. Làm việc với nhiều nhóm nhân vật khác nhau.
5. Chỉ đạo, phối hợp và tích hợp cho nhóm dự án.
6. Chịu trách nhiệm về hiệu suất và thành công của dự án. Phải tạo động lực cho đúng người vào đúng thời điểm để giải quyết đúng vấn đề và đưa ra quyết định đúng đắn.




GIỚI THIỆU VỀ NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

7. Kết hợp nghệ thuật, khoa học và tư duy logic.
8. Kiến thức rộng: tài chính, tiếp thị, tổ chức.
9. Có thể bắt đầu ở những thời điểm khác nhau trong chu kỳ hoạt động của dự án.
10. Giải quyết các vấn đề → tiến độ thực hiện, ngân sách, phân bổ và quản lý nguồn lực, mối quan hệ con người, thương lượng.
11. Chú ý tới toàn bộ bức tranh nhưng không làm tổn hại những chi tiết quan trọng.



VỊ TRÍ CỦA NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

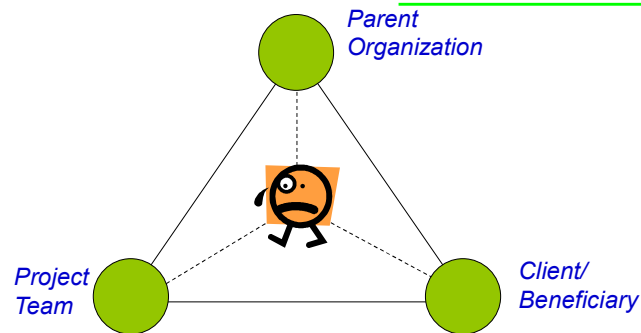

- ◆ Sống trong một thế giới mâu thuẫn
 - Các dự án cạnh tranh về nguồn lực.
 - Mâu thuẫn giữa các thành viên trong dự án.
 - Khách hàng muốn thay đổi yêu cầu.
 - Tổ chức mẹ muốn giảm chi phí.



VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Vai trò:

- Thấy được vị trí của mình trong bối cảnh chung của dự án, các mối tác động chính của các bên tham gia vào dự án, và những đóng góp của các đối tượng liên quan.
- Giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong dự án.

2. Trách nhiệm:


- Cân đối mối liên hệ giữa Chi phí, Thời gian, Chất lượng.



NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN

VAI TRÒ	ĐÓNG GÓP
Nhà quản lý dự án	Định nghĩa, hoạch định, kiểm soát, điều khiển dự án: - Quản lý các mối quan hệ giữa người và người trong các tổ chức của dự án. - Phải duy trì sự cân bằng giữa chức năng: Quản lý và Kỹ thuật của dự án. - Đương đầu với rủi ro trong quá trình quản lý dự án. - Đảm bảo các điều kiện ràng buộc của dự án.
Tổ dự án	Những kỹ năng và nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ.
Nhà bảo đảm	Thẩm quyền, hướng dẫn, duy trì những ưu tiên của dự án.
Khách hàng	Những yêu cầu của sản phẩm và ngân quỹ.
Nhà quản lý chức năng	Hỗ trợ trong việc xây dựng chính sách công ty và cung cấp nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong điều kiện giới hạn của dự án: - Làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. - Nhiệm vụ được hoàn thành ở đâu.

CÁC NHÂN VẬT CHÍNH CỦA DỰ ÁN

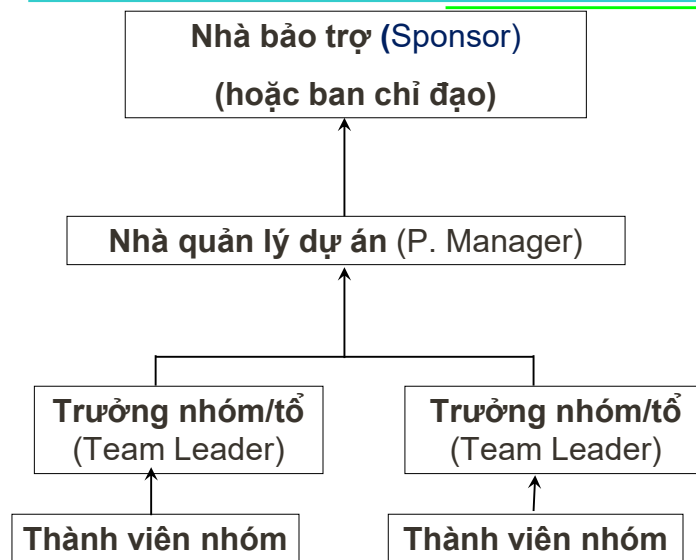



Nhà bảo trợ

Nhà bảo trợ cần có khả năng:

- Hỗ trợ dự án ở cấp độ cao nhất.
- Giải quyết các trở ngại của tổ chức.
- Cung cấp các nguồn lực cần thiết cho dự án (công khai/bí mật).
- Giao tiếp hiệu quả với giám đốc điều hành và các thành phần liên quan khác.

Nhiệm vụ:

1. Đảm bảo truyền đạt cho mọi người, ban lãnh đạo về *tiến độ DA*.
2. Đảm bảo Ban lãnh đạo ủng hộ & trợ giúp các quyết định và định hướng của nhóm.
3. Nhận thức sự thay đổi mục tiêu của công ty ảnh hưởng đến mục tiêu dự án.
4. Làm việc với các phòng ban về hỗ trợ nhân sự cho dự án.



Nhà Quản lý dự án

- Tuyển chọn thành viên phù hợp.
- Cung cấp “khung sườn” hoạt động của DA.
- Định hướng hoạt động.
- Thương thảo với cấp trên, với nhà bảo trợ.
- Hòa giải mâu thuẫn.
- Các hoạch định nguồn lực cần thiết.

- Lập các điểm mốc.
- Đảm bảo mọi thành viên đều có đóng góp và được hưởng lợi.
- Giữ công việc tiến triển đúng hướng.
- Đảm bảo các mục tiêu dự án hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách.

Trưởng nhóm/tổ dự án

Trưởng nhóm là:

- Người khởi xướng; người làm gương; người thương thảo; người biết lắng nghe; người huấn luyện; một thành viên (chính).

Nhiệm vụ:

- Truyền đạt tiến độ và trình bày các vấn đề với nhà QLDA.
- Định kỳ đánh giá tiến độ của nhóm, quan điểm của các thành viên, cách nhìn nhận sự đóng góp của họ.
- Đảm bảo mọi người đều có đóng góp và ý kiến mọi người đều được lắng nghe.
- Chia sẻ công việc.
- Kiểm chế để không hành động như một cấp trên uy quyền.

Chọn trưởng nhóm

- Chỉ định trưởng nhóm.
 - Bầu trưởng nhóm.
 - Luân phiên giữ vị trí trưởng nhóm.
- => Một trưởng nhóm hay nhiều trưởng nhóm?

Thành viên nhóm dự án

Chọn thành viên:

1. **Phân công:** nhà bảo trợ chọn và mời họ tham gia.
2. **Tình nguyện**
3. **Chỉ định:** người có trách nhiệm chỉ định cá nhân tham gia nếu thấy phù hợp.


Đánh giá kỹ năng:

1. Kỹ năng **chuyên môn**,
2. Kỹ năng **giải quyết vấn đề** (tư duy sáng tạo)
3. Kỹ năng **tương tác cá nhân**.
4. Kỹ năng **tương tác tổ chức** (am hiểu tình hình công ty, giao tiếp các phòng ban khác..).

Nhiệm vụ:

- Hoàn tất nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.
- Chia sẻ mối quan tâm, những điều không hài lòng với trưởng nhóm và các thành viên khác.
- Giúp đỡ trưởng nhóm và các thành viên khác, yêu cầu được hỗ trợ khi cần.


MỐI LIÊN HỆ GIỮA 4 YẾU TỐ: Chi phí, Thời gian, Chất lượng & Phạm vi

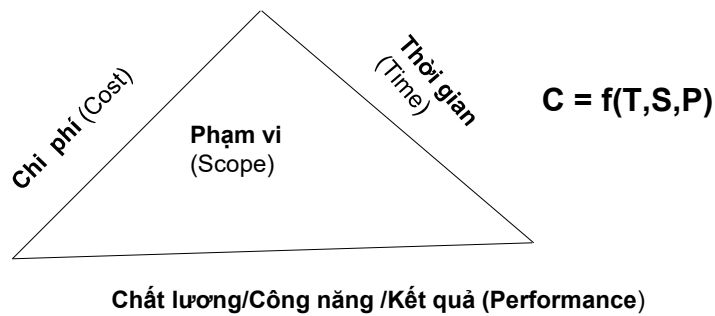


Cấp trên chọn 3 yếu tố .

Nhà QLDA sẽ phải nhận yếu tố còn lại!

KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

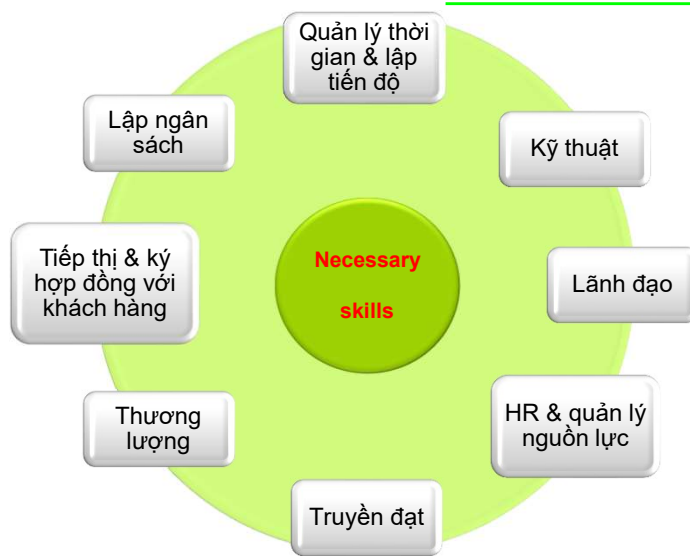

KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

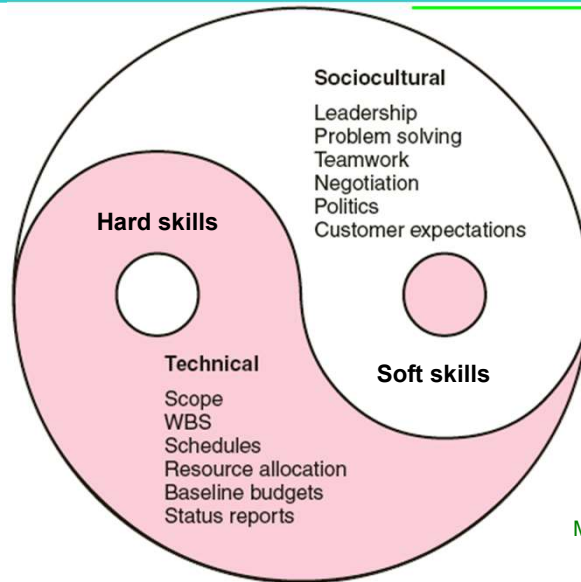

The Technical and Sociocultural Dimensions of the Project Management Process

PHẨM CHẤT CỦA NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Thật thà và chính trực (Honesty & Integrity).
2. Khả năng ra quyết định (Decision Making Ability).
3. Hiểu biết các vấn đề về con người (Understanding of Personal Problem).
4. Tính chất linh hoạt, đa năng, nhiều tài (Versatility).
5. Khả năng giải quyết vấn đề (Problem solving ability).


LỰA CHỌN NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Yêu cầu: (⊗ Làm thế nào để lựa chọn một nhà quản lý dự án?)
 - ❑ Đảm bảo có những kỹ năng được yêu cầu.
 - ❑ Có sự cam kết với mục tiêu của dự án.
 - ❑ Sẵn sàng làm việc với thời gian biểu không ổn định với những ràng buộc mâu thuẫn với nhau.
2. Hướng dẫn chung:
 - ❑ Biết tổng quát > Chuyên sâu (Generalist > Specialist)
 - ❑ Đầu óc tổng hợp > Đầu óc phân tích (Synthesizer > Analyst)
 - ❑ Người làm cho mọi việc dễ dàng (sẵn sàng hợp tác) > Giám sát (Facilitator > Supervisor)

→ thay đổi tùy theo quy mô của dự án.

LỰA CHỌN NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN-tt

Ai là người thích hợp với quản lý dự án?

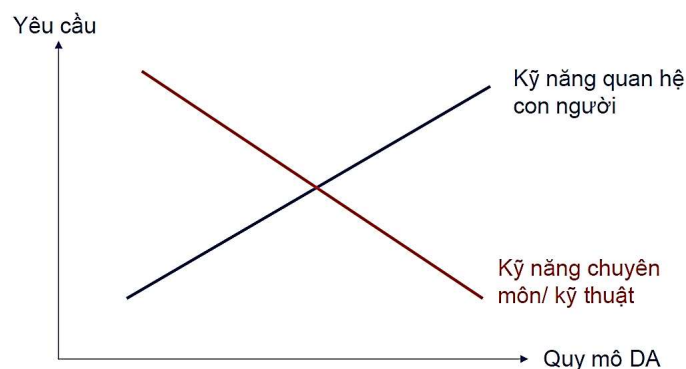

Chọn lựa nhà QLDA theo quy mô



NGUỒN & QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Nguồn lựa chọn:

- Từ các dự án khác.
- Nhà quản lý sản xuất trực tiếp.
- Nhà quản lý chức năng.
- Các chuyên gia chức năng.

2. Quá trình lựa chọn:

- Việc lựa chọn cần được trình bày thẳng thắn với các ứng cử viên mà không có thành kiến.



Yếu tố ảnh hưởng đến thành công của 1 DA

- ◆ Thỏa thuận về các mục tiêu của dự án.
- ◆ Một kế hoạch của dự án để:
 - ◆ Thông báo lịch trình và trách nhiệm.
 - ◆ Đo lường sự phát triển của dự án.



Yếu tố ảnh hưởng đến thành công của 1 DA

- ◆ Thế nào là một kế hoạch DA tốt?
 - A) ai chịu trách nhiệm việc gì vào lúc nào, và trình bày những gì có thể xảy ra.
 - B) ước lượng chi tiết về nhân lực, tài chính, thiết bị, vật liệu cần thiết cho DA.
 - C) có thể dùng nó như một công cụ cảnh báo: dự án bị trễ nải; ngân sách bị vượt quá.



Yếu tố ảnh hưởng đến thành công của 1 DA

- ◆ Giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên liên quan.
 - Kỹ thuật QLDA chủ yếu là kỹ thuật giao tiếp.
- ◆ Kiểm soát được phạm vi DA:
 - Mục tiêu đạt được với thời gian và mức ngân sách; thay đổi về điều kiện thực tế.
 - “Quản lý kỳ vọng của người liên quan”.



Yếu tố ảnh hưởng đến thành công của 1 DA

- ◆ Ứng hộ của cấp quản lý tổ chức
 - Nhà QLDA: dựa vào nhà quản lý chức năng cần có các kỹ thuật “quản lý cấp trên” (manage upward).
 - Nghệ thuật QLDA: kỹ năng "chính trị", quan hệ cá nhân, sử dụng trực giác để ủy thác công việc,...
 - Kỹ năng và hứng thú công việc quản lý.



Yếu tố thúc đẩy quản lý dự án

- ◆ Các yếu tố dẫn đến việc sử dụng quản lý dự án ngày càng tăng:
 - ◆ Nén vòng đời sản phẩm.
 - ◆ Bùng nổ kiến thức.
 - ◆ Ba mục tiêu cốt lõi (hành tinh, con người, lợi nhuận).
 - ◆ Tăng cường tập trung vào khách hàng. Các dự án nhỏ đại diện cho những vấn đề lớn.



Quản lý dự án linh hoạt

- ◆ Là một phương pháp luận xuất hiện do sự thất vọng khi sử dụng các quy trình quản lý dự án truyền thống để phát triển phần mềm.
- ◆ Hiện đang được sử dụng trong nhiều ngành để quản lý các dự án có mức độ không chắc chắn cao.
- ◆ Sử dụng quy trình gia tăng, lặp đi lặp lại đôi khi được gọi là phương pháp tiếp cận 'sóng lặn' để hoàn thành dự án.



Quản lý dự án linh hoạt (tt)

- ◆ Tập trung vào sự hợp tác tích cực giữa dự án và đại diện khách hàng, chia nhỏ các dự án thành các phần chức năng nhỏ và thích ứng với các yêu cầu thay đổi.
- ◆ Thường được sử dụng trước trong giai đoạn xác định để thiết lập các thông số kỹ thuật và yêu cầu, sau đó các phương pháp truyền thống được sử dụng để lập kế hoạch, thực hiện và kết thúc dự án.
- ◆ Hoạt động tốt nhất trong các nhóm nhỏ gồm 4 đến 8 thành viên.



Cách tiếp cận Xã hội – Kỹ thuật trong QLDA


- ◆ Chiều hướng Kỹ thuật (Khoa học):
 - ◆ Bao gồm các phần chính thức, có kỷ luật và hoàn toàn logic của quy trình.
 - ◆ Bao gồm lập kế hoạch, lên lịch và kiểm soát các dự án.



Cách tiếp cận Xã hội – Kỹ thuật trong QLDA

- ◆ Chiều hướng Văn hóa xã hội (Nghệ thuật)
 - ◆ Bao gồm thế giới thực đầy mâu thuẫn và nghịch lý.
 - ◆ Tập trung vào việc tạo ra một hệ thống xã hội tạm thời trong một môi trường tổ chức lớn hơn, kết hợp tài năng của một nhóm chuyên gia khác nhau làm việc để hoàn thành dự án.

Cách tiếp cận Xã hội – Kỹ thuật trong QLDA

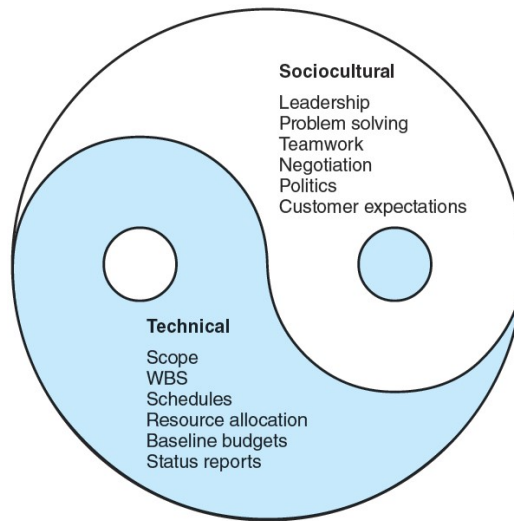

Trọng điểm của Quản lý dự án

- ❖ Cần nắm vững một số công cụ QLDA.
- ❖ “Quan hệ Con người” là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của một dự án.
 - ✓ Quan điểm “tuyến tính” về thế giới không phù hợp với thực tế cuộc sống: Cần tư duy hệ thống (System thinking).
 - ✓ Chính trị: không tránh được trong QLDA.



Kết: QLDA trong thế giới đang đổi thay

1. Dự án: Có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, khác với các *hoạt động thường xuyên*.
2. Nhịp độ *thay đổi ngày càng lớn*: càng cần dự án, càng cần nhà QLDA.
3. Môn học này nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về QLDA, chuẩn bị cho bạn thành nhà QLDA.
